

Sachstand zu den **TOP 10** der **wichtigsten Projekte** aus dem **Investitions- und** **Sanierungsprogramm**



Ausblick

Investitionsprogramm zukünftig **2020 – 2025**

Investitionsprogramm **211.5 Mio. €**

Bisher:

Sanierungen und Investitionen von 2000 bis 2018: **440 Mio. €**



Frh. v. Stein Schule Neckarsteinach

FREIHERR-VOM-STEIN-SCHULE

- Projekt: Ersatzneubau Vierburgen-Sporthalle
- Aktueller Stand: Abstimmung mit der Stadt
- VgV Verfahren Architekt
- Baubeginn: frühestens 2022
- Geplantes Bauende: 2024

Investitions- und Sanierungsprogramm
Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE

Heinrich Böll Schule Fürth

- Projekt: Erweiterung des Klassentraktes
- Stand: Lph 1-2 Vorplanung
- Aktuell: Vorentwurfsplanung in Holzbauweise
- Geplante Fertigstellung: 2021

Investitions- und Sanierungsprogramm

Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE

Langenbergsschule, Birkenau

- Projekt: Sanierung und Umbau der Schule
- Stand: Leistungsphase 3
- Aktuell: Abschluss der LPH 3
- Geplanter Baubeginn : 2021 (Bauabschnitt 1)
- Geplante Fertigstellung: 2024 (Bauabschnitt 2)

Investitions- und Sanierungsprogramm

Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE

Konrad-Adenauer-Schule, Heppenheim

- Projekt: barrierefreie und energetische Sanierung Gebäude A sowie Einbau Mensa – Projektstopp wegen neuer Schulentwicklung zur 5-Zügigkeit
- Aktueller Stand: Schulerweiterung und Abbruch Gebäude A, Planungsphase 0 mit Schulgemeinde begonnen
- Geplante Fertigstellung: frühestens 2023

Investitions- und Sanierungsprogramm

Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE

Schule in den Weschnitzauen Biblis

- Projekt: Ersatzneubau Standort Freiherr-vom-Stein-Str.
- Stand: Lph. 1-3 Vorplanung
- Stand: Abschluss LPH3 - Entwurfsplanung
- Aktueller Geplanter Baubeginn: 2021

Investitions- und Sanierungsprogramm

Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE

Schillerschule, Bürstadt

MENSA

- Hauptgebäude: Ausbau auf 6-Zügigkeit
- Planungsstand Lph1-2: Ersatzneubau Ostbau
- Baubeginn 2020

Investitions- und Sanierungsprogramm

Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE

Schule an der Weschnitz, Einhausen

- Projekt: Ersatzneubau Mehrzweckhalle mit Mensa und Klassenräumen (in Koop. mit Gemeinde)
- Aktueller Stand: Lph. 8 (Ausführung), Ausbaugewerke in der Endmontage, Außenanlage begonnen
- Geplante Fertigstellung: Gebäude Feb. 2020
Außenanlage Mai 2020

Investitions- und Sanierungsprogramm

Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE

Eichendorffschule, Kirschhausen

- Projekt: Generalsanierung, 1. Bauabschnitt Schulbau (2019-2020), 2. Bauabschnitt Verwaltungsbau (2021-2022), 3. Bauabschnitt Außenanlagen 2022-2023
- Aktueller Stand: Rohbau läuft, Ausschreibung der weiteren Leistungen, Planung Außenanlage in LPH 3
- Geplante Fertigstellung: 2023

Investitions- und Sanierungsprogramm

Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE

Altes Kurfürstliches Gymnasium, Bensheim

- Projekt: Gesamtanierung in 5 Bauabschnitten
- Aktueller Stand: 1. und 2. Bauabschnitt fertig, 3. BA begonnen, aktuell Schadstoffsanierung
- Geplante Fertigstellung 3. BA: 4. Quartal 2020

Investitions- und Sanierungsprogramm

Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE

Biedensandcampus, Lampertheim

- Projekt: Moderner Campus mit LGL und ADS
- Aktueller Stand: Planungsphase 0 Schulen abgeschlossen, Planungsphase 0 Campus und Sportflächen bis Abschluss SEP+, Energiekonzept gesamten Campus
- Hochbauplanung ab 2020
- Baubeginn 1. Phase: ab 2022
- Geplante Bauzeit: ca. 10 Jahre

Investitions- und Sanierungsprogramm

Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE

Schlossbergschule Bensheim-Auerbach

- Projekt: Sanierung/Umbau DRK-Gebäude (PfN) und Zusatzbau für Küche und Mensa
- Aktueller Stand: Lph. 8 für DRK Gebäude/ Lph2 für Zusatzbau in Abstimmung mit der Schule
- DRK-Gebäude zum Quartalsende fertig
- Baubeginn Zusatzgebäude: ca. 2021

Investitions- und Sanierungsprogramm

Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE

Karl-Kübel-Schule, Bensheim

- Projekt: Ersatzneubau Hauptgebäude
- Aktueller Stand: Ausführung (Rohbau), Ausschreibung weiterer Gewerke
- Geplante Fertigstellung: 2023


Investitions- und Sanierungsprogramm

Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE

Lindenhofschule, Groß-Rohrheim

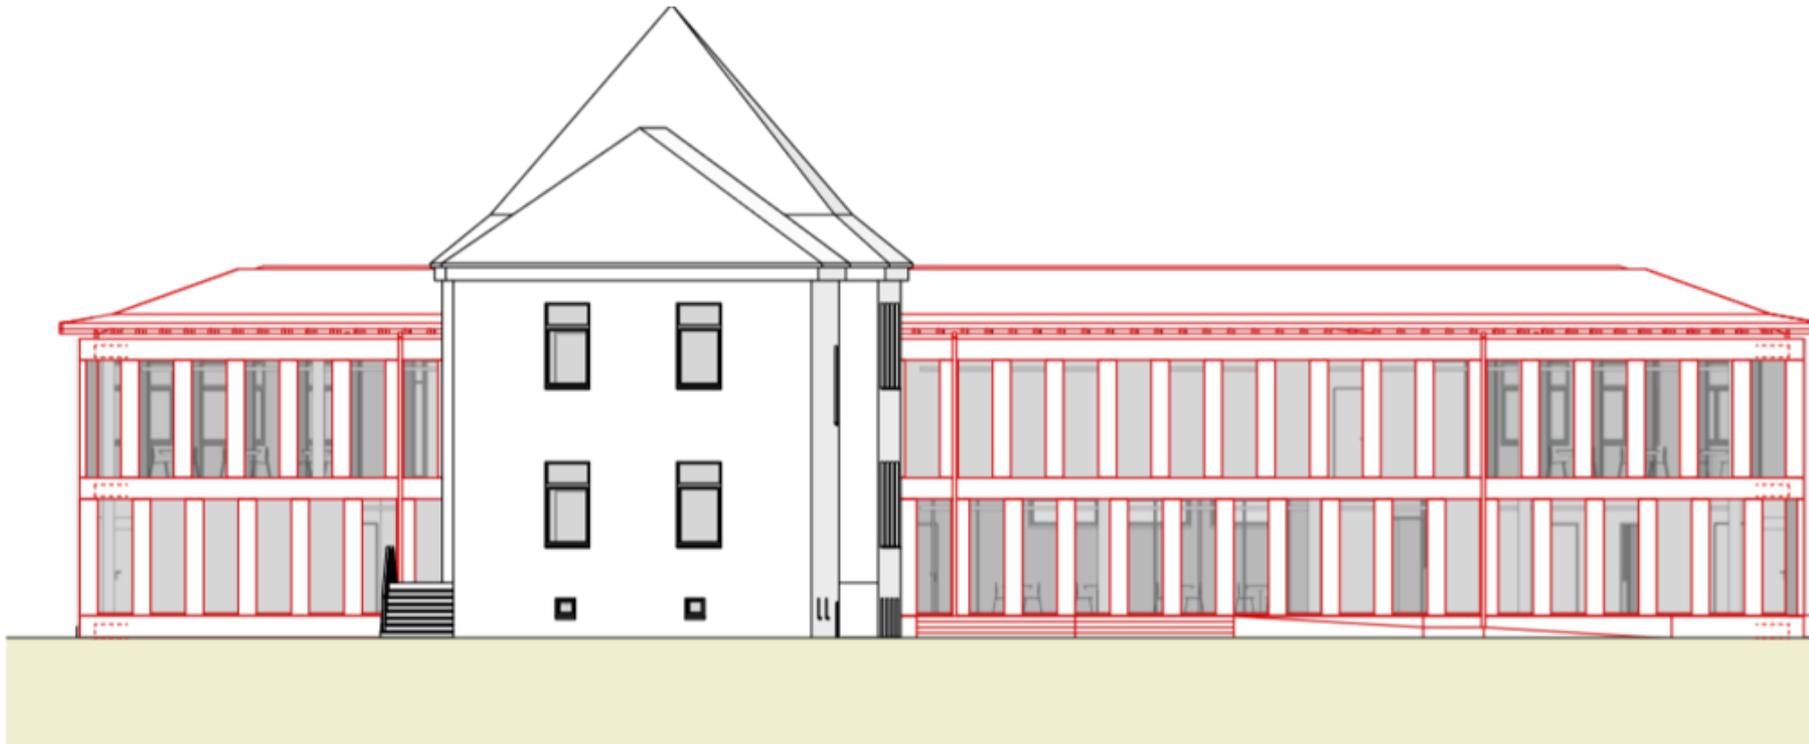

- Projekt: Sanierung und Erweiterung Schulgebäude
- Aktueller Stand: Lph 3. Entwurfskonzept, gesamte Auslagerung der Schule geplant
- Baubeginn 2020

Investitions- und Sanierungsprogramm

Christian Engelhardt | Landrat



KREIS BERGSTRASSE
